

Protocolo 5.162/2023

De: Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos...

Para: SAD-DPG - Divisão de Protocolo Geral

Data: 24/01/2023 às 22:29:56

Setores (CC):

SAD-DPG

Setores envolvidos:

SAD-DPG

Outros (SUJEITO A APROVAÇÃO)

À Secretaria do Meio Ambiente e ao Fiscal do contrato, Felipe Pernomian,

Venho por deste encaminhar o pedido de Aditamento de Prazo do Termo de Parceria nº 020/2022.

Atenciosamente,

Valentina Ertel Fragata
Gestora do TP nº 020/2022

Anexos:

Comprovante_de_endereco_SIMBIOSE.pdf

RG_Valentina.pdf

SD_Aditamento_TP_020_2022_v2.pdf



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.291.769/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2005
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E ORGANIZACAO DOS SETORES ECOLOGICOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) S.I.M.BI.O.S.E.	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO	NÚMERO 170	COMPLEMENTO *****
CEP 12.941-172	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITAPERI	MUNICÍPIO ATIBAIA
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (11) 5327-0060	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/12/2021** às **09:06:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

NÃO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8200-8

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



POLEGAR DIREITO



44774E53

Valentina Drogala

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

8200-S

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

38.007.802-8

2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 21/01/2019

NOME

VALENTINA ERTÊL FRAGATA

FILIAÇÃO

OSMAR DOS SANTOS FRAGATA
MONICA ERTEL

NATURALIDADE

S.PAULO - SP

DATA DE NASCIMENTO

05/10/1994

DOC ORIGEM

SÃO PAULO-SP SANTA CECILIA CN:LV.A029/FLS.196V/Nº00702

CPF

420909108/10

Caetano Paulo Filho
Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisório IIRGD. SSP. SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

NÃO PLASTIFICAR



24 de janeiro de 2023

Solicitação de Aditamento de Prazo e Recurso do
Termo de Parceria Nº 020/2022.



1. OBJETIVO DO TERMO DE PARCERIA

O Termo de Parceria nº 020/2022, tem como objetivo geral firmar Termo de Parceria, em estreita cooperação com a PEA, com entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público—OSCIP, nos termos da Lei Federal nº9.790/1999, alterada pela Lei Federal nº13.019/2014 e Lei Federal nº 13.204/2015, para a execução e fomento de ações de prevenção, combate a incêndios florestais e restauração florestal na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Atibaia, em consonância com os objetivos da Unidade de Conservação.”

2. SITUAÇÃO DAS METAS E AÇÕES

O Plano de Trabalho elaborado para realizar a cogestão da APA do Rio Atibaia, está dividido em 3 Metas, contendo 14 atividades. Assim, para melhor exposição de seu cumprimento, podemos elencar o desenvolvimento das metas até a presente data em:

- Executadas

- Executada Parcialmente

- Não Executada Por Fatores Terceiros

- Não Executada

Das metas e ações:

1. Prevenção e combate a Incêndios Florestais

a) **Elaboração e aprovação de PPCIF;**

Considerando:

1. Já existe um protocolo de entrega deste documento, enviado dentro do prazo estipulado, está aguardando aprovação do órgão responsável.

b) **Elaboração e divulgação de conteúdos educativos, por postagem, sobre a APA do Rio Atibaia, sobre prevenção e combate a incêndios e outros temas socioambientais;**

Considerando:

1. Foram entregues uma parte dos conteúdos, listados nos relatórios bimestrais, vide também em redes sociais SIMBiOSE.

2. Para a finalização dessa atividade, resta apenas uma postagem com a Indicação e justificativa dos locais escolhidos para instalação das placas de PONTOS DE OBSERVAÇÃO da Brigada Florestal Itapetinga, prevista para o final de janeiro.

c) Elaboração e divulgação de conteúdos educativos, por Transmissão ao Vivo (Live) ou evento presencial, sobre a APA do Rio Atibaia, sobre prevenção e combate a incêndios e outros temas socioambientais;

Considerando:

1. A previsão é da realização de mutirão na primeira semana de fevereiro, com os Escoteiros da Pedra Grande, para a confecção de um mural de conscientização socio ambiental a respeito das queimadas que acontecem na área onde será realizado plantio de muvuca, também atrelado a atividade de Restauração.

2. Foi realizada uma no SIPAT (Semana Interna de Prevenção a acidentes de Trabalho) na empresa CONDAT do Brasil em setembro de 2022, com procedimentos protocolares da Brigada Voluntaria Itapetinga e sua atuação na APA do Rio Atibaia. Disponível em: <https://www.instagram.com/tv/CjQTGcKnmfq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

d) Realizar visitas técnicas a propriedades (sítios e fazendas), escolas, centros comunitários e outros pontos de encontro de pessoas na região da APA do Rio Atibaia para abordagens preventivas e cadastramento de proprietários interessados em participar de atividades;

Considerando:

1. As abordagens preventivas e orientativas já são feitas durante as rotas programadas nos dias de trabalho

2. Existe uma agenda com 2 reuniões de pais marcadas na Escola Municipal Paulo Freire para nos apresentar e identificar pais interessados em cadastrar suas propriedades. As reuniões estão marcadas para dia 02 de fevereiro nos turnos matutino e vespertino, para o prosseguimento dessa atividade.

3. Outras visitas técnicas realizadas nas seguintes propriedades: Pedreira, CONDAT do Brasil.

e) Efetuar ações de prevenção e combate a incêndios florestais;

Considerando:

1. Que a partir dos pontos de observação definidos, está prevista a instalação das Placas Orientativas confeccionadas para orientar a população a denunciar focos de incêndio e outros crimes ambientais;

2. A previsão meteorológica, foi programado a instalação de placas em fevereiro para atender seu objetivo e evitar a degradação do material utilizado durante o período de chuva.

3. Aceiros de contenção mecânica do fogo foram confeccionados na área de indicação para restauração florestal com o intuito de cumprir também tal demanda. A manutenção desses aceiros será feita por um pedido que será protocolado pedindo para a secretaria responsável da Prefeitura Municipal.

f) Efetuar denúncias de incêndios avistados, mas não combatidos para a prefeitura de Atibaia.

2. Restauração Florestal

g) Elaboração e aprovação de PERF;

Considerando:

1. Que a apresentação do documento no dia 20/09/2022; contemplava a restauração de 3 hectares e ações em outros polígonos além dessa área. Ao decorrer das atividades, percebeu-se que a situação da área para execução do projeto de restauração florestal inicial, demandaria maior empenho.

2. Tendo em vista a limitação de contratação de mão de obra e tempo hábil para realização do que foi previsto inicialmente do PERF, decidiu-se concentrar o planejamento para restauração florestal somente na área dos 3 hectares.

3. No momento atual, se espera a concessão da área indicada para apresentar uma nova versão do PERF com foco na área especificada no protocolo nº 48.308/2022 - Despacho 7.

h) Elaboração e divulgação de conteúdos educativos, por postagem, sobre a APA do Rio Atibaia, sobre restauração florestal e outros temas socioambientais;

Considerando:

1. Os conteúdos faltantes dependem de outras atividades supracitadas, a restauração florestal, tema importante para o termo de parceria, precisa de tempo para mostrar os resultados empíricos da realização afim de colher maior número de dados para produção dos conteúdos.

i) Realização de mutirão com população local e demais interessados para implementação das atividades previstas no PERF;

Considerando:

1. O excesso de chuvas no final de dezembro e começo de janeiro atrasando as atividades em campo e conseqüentemente o preparo do solo;

2. A necessidade de um diagnóstico bem definido da área para escolher a técnica de restauração mais adequada;
3. As dificuldades no preparo da área antes da implantação do sistema de “MUVUCA” escolhido para a restauração, como a mata competição e falta de manejo adequado no plantio existente.
3. A constatação de perigo por contaminação na área por presença de carrapatos transmissores de Febre Maculosa;
4. Os reparos necessários nas estruturas de cercamento da área pública delimitada para a segurança da implantação do projeto de restauração;
5. A presença de crianças de escolas da região para participar do mutirão e aguardar o período de férias escolares;
6. A data de para a realização do mutirão para implantar o sistema de Muvuca, está prevista para 11 e 12 de fevereiro de 2023;

j) Elaboração de mini documentário sobre a importância ambiental, cultural e histórica do Rio Atibaia e as ameaças atuais decorrentes da perda de habitats.

Considerando:

1. A necessidade de acompanhar a implantação do projeto de Restauração Florestal, tendo como tema principal do TP nº 020/2022;
2. A coleta de entrevista e depoimentos com terceiros;
3. O processamento do material para produção do mini-documentário com entrega prevista para a última semana de março;

k) Execução de atividades de preparo, implantação e manutenção de área descritas no PERF.

Considerando:

1. Os tramites para conceder a anuência da área a ser restaurada;
2. A existência de outros plantios na área, dificultando o manejo do solo;
3. A necessidade de apostilamento de valores dos gêneros de despesa, previsto no edital para possibilitar a contratação de serviços de manejo agrícola para preparo da área;
4. A necessidade do monitoramento frequente, no primeiro semestre após a semeadura, para garantia do desenvolvimento do sistema de muvuca. Ressaltando a alta mata competição na área;

l) Mapeamento de matrizes para possíveis iniciativas de coleta e beneficiamento de sementes;

Considerando:

1. Que o início do projeto deu se em época de estiagem e priorizou os combates a incêndios, o início de algumas atividades foram prorrogadas.
2. Haverá mais três datas marcadas para realização desta atividade, previstas para 17/02/2023, 03 e 17/03/2023.

m) Realocação de plantas epífitas e outras formas de vida, identificação, cadastramento e reintrodução em fragmentos florestais da APA do Rio Atibaia.

Considerando:


1. Que está previsto o ultimo campo no dia 03/02/2023 para identificação, cadastramento para futuramente realizar a realocação em meados de abril.
2. A fase final de realocação das plantas necessita de um tempo para alcançar a estabilização de algumas espécies, assim como a floração para comprovação da identificação da espécie e para ter a segurança de que a realocação seja efetiva.

3. Estudos ambientais

n) Realização de levantamento estimativo de fauna atropelada, vítima de predação por cães e gatos ferais ou eletrocutada (baseado em avistamento) durante realização do Termo de Parceria.

Segue o gráfico quantificando o atendimento das atividades do projeto até o presente momento.

Atendimento de atividades TP nº 020/2022

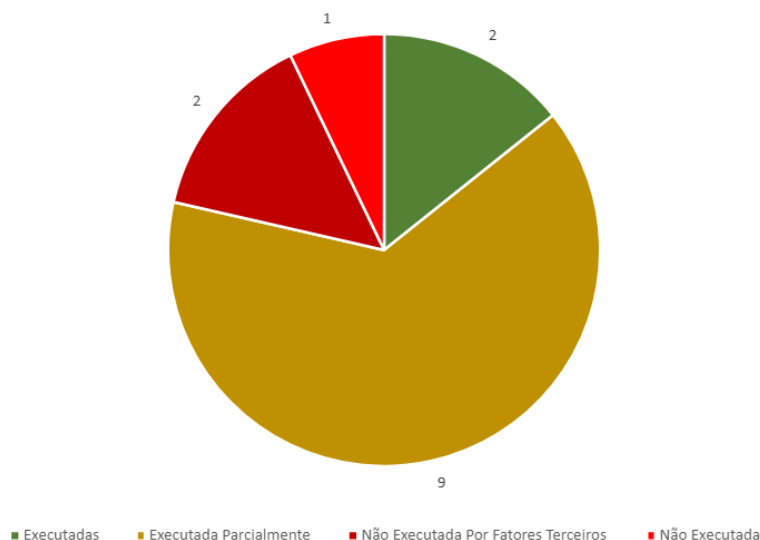

4. Gestão e Finanças – Ao longo do projeto são realizadas atividades administrativas como reuniões semanais com a equipe, cronogramas, protocolos via Onedoc, interface com parceiros, gerenciamento de dados, apresentação de relatórios, interface com parceiros, integração socioambiental, relatórios financeiros mensais, contabilidade de gastos e investimento e prestação de contas no Sicovinho.

3. QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES ENTREGUES E PREVISTAS

Metas	Status	Produto	Qtd	Previsão de entrega	Conteúdo previsto
Elaboração e aprovação de PPCIF		Protocolo n	1\1	Fev/23	Area depende da anuência da Prefeitura Municipal
Elaboração e divulgação de conteúdos educativos, por postagem, sobre a APA do Rio Atibaia, sobre prevenção e combate a incêndios e outros temas socioambientais		Postagem	7\8	Abr/23	Instalação das placas de orientação e prevenção de incêndio. Prevendo o início da temporada de seca em 2023 para cumprimento de outras atividades extras.
Elaboração e divulgação de conteúdos educativos, por Transmissão ao Vivo (Live) ou evento presencial, sobre a APA do Rio Atibaia, sobre prevenção e combate a incêndios e outros temas socioambientais		Lives ou eventos realizados	1\2	Abr/23	A live será feita após os primeiros dados de crescimento das sementes implantadas. Em torno de 20 a 30 dias após implantação.
Realizar visitas técnicas a propriedades (sítios e fazendas), escolas, centros comunitários e outros pontos de encontro de pessoas na região da APA do Rio Atibaia para abordagens preventivas e cadastro de proprietários interessados em participar de atividades		Relatório	2\4	Fev/23	Aguardando o resultado da reunião marcada em fevereiro para decidir como será o último item para entrega dessa atividade
Efetuar ações de prevenção e combate a incêndios florestais		Relatórios	3\4	Fev/23	O relatório Bimestral 4\4 está previsto para ser entregue no dia 23 de fevereiro com o último item desta atividade.
Efetuar denúncias de incêndios combatidos e avistados, mas não combatidos para a prefeitura de Atibaia		Relatórios	4\4	Fev/23	O relatório Bimestral 4\4 está previsto para ser entregue no dia 23 de fevereiro com o último item desta atividade.
Elaboração e aprovação de PERF		Documento	0\1	Fev/23	Alterações protocoladas para concessão da área.

Elaboração e divulgação de conteúdos educativos, por postagem, sobre a APA do Rio Atibaia, sobre restauração florestal e outros temas socioambientais		Publicações	4\8	Abr/23	1. Diagnóstico implantação 2. Preparo do solo para muvuca 3. Implantação semeadura direta 4. Manutenção e manejo da área.
Realização de mutirão com população local e demais interessados para implementação de atividades previstas no PERF		Evento	0\2	Fev/23	Data prevista para realização em 11 e 12 de fevereiro de 2023.
Elaboração de minidocumentários sobre a importância ambiental, cultural e histórica do Rio Atibaia e as ameaças atuais decorrentes de habitats		Publicação	0\1	Mar/23	Estreia prevista após implantação da Muvuca.
Execução de atividades de preparo, implantação e manutenção de área descritas no PERF		Relatórios	3\4	Fev/23	Monitoramento da implantação previsto até julho de 2023.
Mapeamento de matrizes para possíveis iniciativas de coleta e beneficiamento de sementes		Relatórios	3\4	Abr/23	Compilação dos dados colhidos em campo após abril de 2023
Recolocação de plantas epífitas e outras formas de vida, identificação, cadastro e reintrodução em fragmentos florestais de APA do Rio Atibaia		Relatórios	3\4	Fev/23	Previsão de realocação das epífitas até abril de 2023.
Realização de levantamento estimativo de fauna atropelada, vítima de predação por cães e gatos ferais ou eletrocutada (baseado em avistamento) durante realização do Termo de Parceria		Estudo realizado	1\1	Fev/23	Entrega de estudo realizado a partir dos dados coletados até março de 2023

4. FINANCEIRO

O saldo remanescente do Banco Caixa Econômica Federal, **Agência 1527 Operação 003 Conta Corrente 553-6**, no qual está destinada a receber os valores empenhando para a celebração deste presente termo de parceria, na data de hoje possui o montante de **R\$ 45.150,16 (Quarenta e cinco mil cento e cinquenta reais e dezesseis centavos), conforme Anexo 1.**

Podemos considerar que:

- O pagamento das despesas referente a janeiro e os 22 dias de fevereiro (final previsto do Edital sem aditamento), tendo como base o valor gasto médio mensal, ficará em torno de R\$ 29.724,86 como demonstra a tabela abaixo;

Relatórios	Protocolos	Mês	Valor
1º Relatório Financeiro	46.510/2022	Junho/Julho	R\$ 19.808,35
2º Relatório Financeiro	46.510/2022	Agosto	R\$ 16.677,86
3º Relatório Financeiro	57.140/2022	Setembro	R\$ 15.312,33
4º Relatório Financeiro	57.140/2022	Outubro	R\$ 15.187,72
5º Relatório Financeiro	62.468/2022	Novembro	R\$ 15.269,83
6º Relatório Financeiro	3.484/2022	Dezembro	R\$ 13.151,39
Media mensal			R\$ 16.367,91

- Por tanto o saldo remanescente juntamente com o recebimento da 3ª Parcela do Termo de Parceria, será de **R\$ 40.175,30**, sendo o suficiente para a realização das atividades durante o período de 02 meses.

- Segundo a projeção supracitada a cima, após dois meses de aditivo de prazo, restará o valor de R\$ 7.439,48 previsto para Equipamentos e Serviços.

5. PEDIDO DE ADITAMENTO DE PRAZO

Diante dos fatos supracitados neste documento, solicitamos que prorrogue por **2 meses** o Termo de Parceria N° 020/2022 adiando seu prazo de vigência até 24 de Abril de 2022, sem recurso adicional.

5. NOVO PLANO DE TRABALHO

Metas	Ações	Comprovação	Produtos	Qty	Início	Término
Prevenção e Combate a Incêndios Florestais	Elaboração e divulgação de conteúdos educativos, por postagem, sobre a APA do Rio Atibaia, sobre prevenção e combate a incêndios e outros temas socioambientais	Publicações realizadas	Publicações	1	Mês 8	Mês 10
	Elaboração e divulgação de conteúdos educativos, por Transmissão ao Vivo (Live) ou evento presencial, sobre a APA do Rio Atibaia, sobre prevenção e combate a incêndios e outros temas socioambientais	Eventos realizados	Mutirão Escoteiros	1	Mês 8	Mês 8
	Realizar visitas técnicas a propriedades (sítios e fazendas), escolas, centros comunitários e outros pontos de encontro de pessoas na região da APA do Rio Atibaia para abordagens preventivas e cadastro de proprietários interessados em participar de atividades	Registro fotográfico e descrição das ações	Relatório	2	Mês 8	Mês 8
Restauração Florestal	Elaboração e aprovação de PERF	Documento escrito	Documento	1	Mês 8	Mês 8
	Elaboração e divulgação de conteúdos educativos, por postagem, sobre a APA do Rio Atibaia, sobre restauração florestal e outros temas socioambientais	Publicações realizadas	Publicações	4	Mês 8	Mês 10

	Realização de mutirão com população local e demais interessados para implementação de atividades previstas no PERF	Lives ou eventos realizados	Evento	2	Mês 8	Mês 9
	Elaboração de minidocumentários sobre a importância ambiental, cultural e histórica do Rio Atibaia e as ameaças atuais decorrentes de habitats	Publicação realizada	Publicação	1	Mês 8	Mês 10
	Execução de atividades de preparo, implantação e manutenção de área descritas no PERF	Registro fotográfico e descrição das ações realizadas	Relatórios trimestrais	2	Mês 8	Mês 10
	Mapeamento de matrizes para possíveis iniciativas de coleta e beneficiamento de sementes	Registro fotográfico e descrição das ações realizadas	Relatórios	1	Mês 8	Mês 10
	Recolocação de plantas epífitas e outras formas de vida, identificação, cadastro e reintrodução em fragmentos florestais de APA do Rio Atibaia	Registro fotográfico e descrição das ações realizadas	Realocação	1	Mês 10	Mês 10

Saldo

Horários e Limites

Saldo próprio disponível	45.150,16 C
Aplicacao c/resg.autom	46.644,76 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucao	0,00 C
Saldo disponível	45.150,16 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FIC GIRO MPE DI	23/01/2023	46.644,76 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
24/01/2023	240938	ENVIO TED	94,60 D	94,60 D
24/01/2023	241039	ENVIO TED	1.400,00 D	1.494,60 D

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DFD9-07BD-0C53-A3BB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ASSOCIAÇÃO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES ECOLÓGICOS (CNPJ 07.291.769/0001-55) em 24/01/2023 22:31:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/DFD9-07BD-0C53-A3BB>
