



Atibaia, 10 de novembro de 2021

SOLICITAÇÃO DA 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO E 1º ADITIVO DE VALOR TERMO DE PARCERIA 028/2020

À Prefeitura da Estância de Atibaia

A/C: Felipe Pernomian

A Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológico – SIMBIOSE, inscrita no CNPJ nº 07.291.769/0001-55, vem por meio deste solicitar a esta Secretaria de Meio Ambiente a prorrogação de prazo do Termo de Parceria nº 028/2020 até a data de 12 de fevereiro de 2022.

Tal pedido é baseado no andamento dos objetivos específicos e metas do Termo de Parceria, conforme exposto nas próximas páginas.


1. Objetivos Específicos, Atividades, Metas e Indicadores

O TP 028/2020 possui 9 objetivos específicos e 77 atividades diretamente relacionadas a estes. Deste universo, temos os seguintes status:






Figura 1 – Status das atividades do TP 028/2020 em 10.11.2021

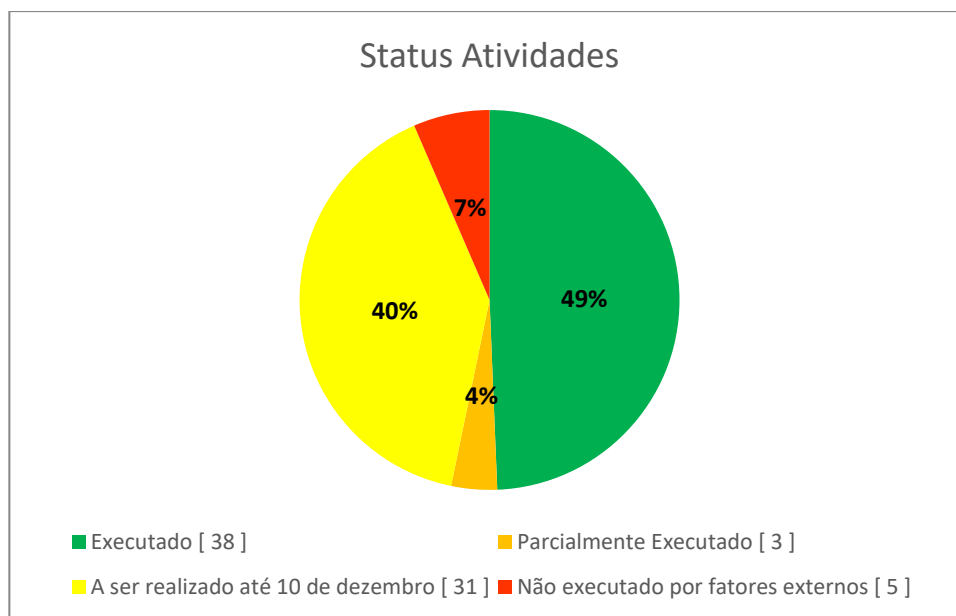

Já em relação às metas, que são 21, associadas a 53 indicadores:

Figura 2 – Status dos indicadores do TP 028/2020 em 10.11.2021

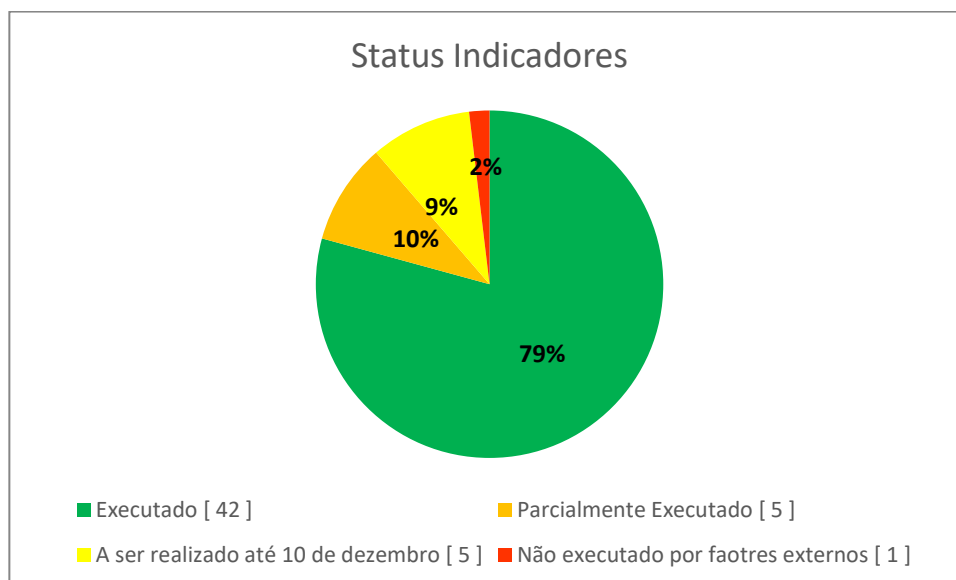

As tabelas 1 e 2 nas próximas páginas apresentam maiores detalhes sobre o andamento do projeto, justificando cada status que não está finalizado e já descrito nos relatórios apresentados à Secretaria de Meio Ambiente.





Tabela 1 – Status das atividades do TP 028/2020 em 10.11.2021

Objetivos Específicos (Ações)	Atividades	Status	Observação
Realizar ações emergenciais de ordenamento de uso do Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande para iniciar implantação do referido Plano de Uso Público	Apoiar demanda de visitação oriunda do Parque Natural Municipal da Grota Funda	Não executado por fatores externos	PNMGF permanece fechado, sem visitação
	Instalar sinalização e barreiras naturais ao ingresso de pessoas, veículos, equinos e bovinos nos acessos não oficiais do Complexo	Executado	
	Cadastrar e mapear todos os acessos ao Complexo, qualificando-os quanto ao tipo de acesso realizado (carros, motos, bicicletas, pedestres, cavalos etc.), quanto ao grau de conservação, quanto ao tipo e frequência de uso (regular e ou irregular, usado ou pouco usado, caça, coleta de plantas, motociclistas, ciclistas, pedestres etc.), enquadrá-los no zoneamento das UCs	Executado	
	Em parceria com Secretaria de Serviços Públicos da PEA, apoiar a CEMA na solicitação de prestação de serviços para manutenção de acessos regulares ou passíveis de regularização, considerando o trânsito de veículos no Complexo e em suas imediações que levam às entradas principais	Executado	
	Desenvolver roteiros que gerem a inserção da Laje da Pedra Grande no Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande e a interação deste complexo com atrativos naturais, rurais e	Executado	



	culturais de propriedades privadas de seu entorno;		
	Firmar parcerias com a rede pública municipal de ensino e rede pública estadual de ensino para promover estudos do meio em roteiros do Complexo	Não executado por fatores externos	As atividades escolares foram comprometidas durante a pandemia da COVID-19.
	Firmar parcerias com a rede privada de ensino para promover estudos do meio em roteiros do Complexo	Não executado por fatores externos	
	Realizar acantonamentos no Complexo em parceria com escolas, grupos de escoteiros e outros para a realização de atividades de observação de estrelas, fauna noturna e atividades lúdicas	Não executado por fatores externos	
	Elaborar Cartilha de Boas-Vindas do Complexo na qual constem i) Manual de Conduta do estudante, do visitante, do operador de atividades de turismo e do prestador de serviços; ii) atividades permitidas e não permitidas; iii) plano de emergências; dentre outras informações	Executado	
	Cadastrar o <i>trade</i> de turismo local interessado em realizar atividades de visitaç�o no Complexo	Executado	
	Diagnosticar o perfil de visitantes atendidos pelo referido <i>trade</i> e o perfil desejado de visitaç�o para o Complexo	Parcialmente Executado	O perfil desejado j� e conhecido, mas as informa�es dos clientes dos operadores de turismo ser�o solicitadas ap�s a capacita�o de operadores. Tal capacita�o foi afetada



			pela pandemia da COVID-19.
	Definir atividades permitidas e não permitidas conforme materiais bibliográficos de referência	Executado	
	Realizar capacitação do <i>trade</i> de turismo para operar dentro do Complexo, considerando os roteiros guiados e autoguiados disponibilizados e a inserção de um protocolo de conduta a ser seguido pelo setor	Parcialmente Executado	O curso está em preparação, mas seu conteúdo já foi elaborado de acordo com o alinhamento da equipe SIMBIOSE, a SEMA e Fundação Florestal.
	Organizar agenda de visitação dos roteiros guiados e autoguiados do parque;	Executado	
	Realizar cadastramento de voluntários interessados em realizar ações (prevenção e combate a incêndios, manejo de trilhas, manejo de cursos d'água, plantios, aulas, palestras, feiras de troca de alimentos, dentre outras)	Executado	
	Elaborar e aplicar atividades de vivências com a natureza em eventos de visitação de escolas e instituições	Não executado por fatores externos	As atividades escolares foram comprometidas durante a pandemia da COVID-19.
Realizar ações de prevenção e combate a incêndios florestais nas propriedades inseridas no Complexo e seu entorno	Realizar cadastramento de voluntários interessados em realizar ações no Complexo (prevenção e combate a incêndios, manejo de trilhas, manejo de cursos d'água, plantios, aulas, palestras, feiras de troca de alimentos, dentre outras)	Executado	
	Promover treinamento para voluntários envolvendo	A ser	Atividade já cumprida,



	comunidade do entorno e parceiros institucionais	realizado até 10 de dezembro	porém está em andamento o "2º Módulo de Treinamento de Combate a Incêndios Florestais".
	Realizar vistorias em propriedades rurais que estejam usando a prática do fogo para queima controlada de resíduos, informando sobre a ilicitude desta e de outras práticas	Executado	
	Manter equipamento mínimo de segurança e de combate a incêndios florestais	Executado	
	Em parceria com Secretaria de Serviços Públicos da PEA, apoiar a CEMA na solicitação de prestação de serviços para roçada e manutenção de acessos visando incrementar sua função enquanto aceiros mecânicos	Executado	
	Efetuar ações de monitoramento do risco de incêndio delimitando áreas mais suscetíveis à propagação de incêndios bem como emitindo boletins de risco de incêndio com base em dados meteorológicos	Executado	
	Combater incêndios no Complexo e em suas imediações	Executado	
	Após incêndios, alimentar banco de dados (data, coordenada UTM, horário de início, Tempo de Resposta, Duração do Combate, equipes envolvidas, número de pessoas envolvidas na operação, área queimada, vegetação atingida, localização em relação a áreas de especial interesse para conservação) suporte para elaboração de denúncia à CEMA ou Polícia Militar Ambiental (PMamb)	Executado	



	Realização de denúncias de incêndios florestais à CEMA ou PMamb com geração de número de protocolo e acompanhamento da apuração	Executado	
	Em conjunto com equipe de gestão do PNMGF, definir heliporto dentro do Complexo e mapeamento de corpos lacustres próximos para suporte aéreo às ações de combate a incêndios florestais na unidade, no PEI, no MONA e nas respectivas zonas de amortecimento	Executado	
Realizar ações de sensibilização e esclarecimento do público visitante acerca da realidade socioambiental e fundiária existente no Complexo	Elaborar questionário quali-quantitativo a ser aplicado previamente e/ou no ingresso à laje da Pedra Grande por sua estrada de acesso e por trilhas (Pousada Pedra Grande, Minha Deusa e Grotta Funda) o qual considere a categorização do perfil do visitante, sua disposição futura pelo pagamento de ingresso para entrada e possível existência de pontos de Alimentos & Bebidas e hospedaria no local	Executado	
	Estabelecer contato e relação próxima com Secretaria de Comunicação da PEA para organização de pautas ao longo de todo o contrato	Executado	
	Elaborar Cartilha de Boas-Vindas do Complexo na qual constem i) Manual de Conduta do estudante, do visitante, do operador de atividades de turismo e do prestador de serviços dentro do parque; ii) atividades permitidas e não permitidas; iii) plano de emergências; dentre outras informações	A ser realizado até 10 de dezembro	Folheto de Boas-Vindas já elaborado, cartilha de Educação Ambiental em desenvolvimento
	Realizar cadastramento de voluntários interessados em realizar ações no parque (prevenção e combate a incêndios, manejo de trilhas, manejo de cursos d'água, plantios, aulas,	Executado	



	palestras, feiras de troca de alimentos, dentre outras)		
	Elaborar Plano de Comunicação que preveja a execução de ações de comunicação externa (vídeos, postagens, dentre outros)	Executado	
	Manter estreita e respeitosa relação com os proprietários de imóveis envolvidos no projeto, obtendo seu apoio e autorização formal para realização das atividades	Executado	
	Participar ativamente de discussões em fóruns municipais e regionais adequados para apresentar e esclarecer o projeto, além de divulgar seus resultados (conselhos municipais, conselhos das UCs envolvidas, câmaras municipais, dentre outros)	Executado	
	Manifestar-se quanto ao projeto somente por meio de veículos de comunicação oficiais do projeto	Executado	
	Realizar evento de finalização do projeto e apresentação de resultados	Parcialmente Executado	Evento em preparação para realização em 12/02/2022
Elaborar e executar monitoramento quali-quantitativo da visitação a partir de método de coleta de informações a ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela PEA	Elaborar questionário quali-quantitativo a ser aplicado previamente e ou no ingresso à laje da Pedra Grande por sua estrada de acesso e por trilhas (Pousada Pedra Grande, Minha Deusa e Grota Funda) o qual considere a categorização do perfil do visitante, sua disposição futura pelo pagamento de ingresso para entrada e possível existência de pontos de Alimentos & Bebidas e hospedaria no local	Executado	
Organizar, monitorar e	Organizar, monitorar e fiscalizar as atividades de voo livre	Executado	Rotina de



fiscalizar as atividades de voo livre em parceria com o Clube Atibaiense de Voo Livre	em parceria com o Clube Atibaiense de Voo Livre		monitoramento da atividade
Elaborar e executar sistema de monitoramento da flora xérica persistente no Complexo, assim como manejo teste para controle de espécies graminóides invasoras	Realizar mapeamento de distribuição da vegetação e de sua riqueza (considerar dados primários e secundários)	Executado	
	Realizar quantificação de área (unidade – hectare) de campo rupestre perdida, considerando como data corte a abertura da estrada de acesso à laje da Pedra Grande	Executado	
	Levantar dados da riqueza específica esperada para os microhabitats denominados Ilhas de Solo a partir de uso de modelo matemático a ser considerado pela CONTRATADA e aprovado pela PEA	Executado	
	Realizar análise de evidências de impacto ambiental ocorrentes no Complexo (considerando dados primários e secundários) com metodologia a ser apresentada pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE	Executado	
Realizar ou adequar o Cadastro Ambiental Rural das propriedades contidas no Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande	Realizar ou adequar o Cadastro Ambiental Rural das propriedades contidas no Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande	A ser realizado até 10 de dezembro	
Produzir Projetos Individuais de Propriedades (PIPs) em consonância com as	Levantar dados de hidrografia corrigida	A ser realizado até 10 de dezembro	



adequações do CAR, do Programa de Regularização Ambiental (PRA) e dos instrumentos de gestão das UCs, quando se tratar de propriedades rurais	Levantar dados de pedologia, declividade, clinometria e hipsometria (dados secundários);	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Levantar dados de uso do solo nas propriedades	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Levantar dados de áreas suscetíveis à ocorrência de movimentos de massa, erosão e inundação (utilizar dados secundários de IGC, DAEE, CPRM, dentre outros) aprovados pela PEA	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Levantar dados de fragmentos de vegetação nativa e caracterização de estágio sucessional	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Levantar dados de análise de fragmentação da vegetação nativa em um contexto de paisagem	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Levantar dados de indicação das culturas agrícolas de subsistência, comerciais e demais atividades econômicas existentes	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Levantar dados de limite e tamanho da propriedade (unidade de área - hectares)	A ser realizado até 10 de	



		dezembro	
	Levantar dados de indicação de quantidade de módulos fiscais da propriedade em relação à unidade de módulos fiscais municipal	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Levantar dados de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal (unidade de área – hectares)	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Levantar dados de áreas indicadas para execução de projetos de restauração ecológica, separando-as por técnica adequada à situação encontrada	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Levantar dados de demanda eventual de cercamento para projeto de restauração ecológica (unidade de medida – metros)	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Levantar dados de ativos florestais com possível indicação para Servidão Ambiental ou Cotas de Reserva Ambiental	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Levantar dados de quantidade de pessoas residentes;	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Levantar dados de número de residências e unidades habitacionais com indicação de número médio de	A ser realizado	



	residentes e visitantes para cálculo volumétrico estimativo de efluente gerado, além de levantamento de sistemas de disposição e tratamento de efluentes atualmente utilizados (proposta de instalação de saneamento rural, se for o caso)	até 10 de dezembro	
	Levantar dados de caracterização volumétrica e qualitativa (lixo comum, lixo reciclável e lixo orgânico) dos resíduos sólidos gerados, bem como indicação da(s) destinação(ões) e mapeamento da área de cobertura da coleta de lixo municipal (mapa com polígono da área de cobertura e informação de dias e horários da coleta, caso exista o sistema público)	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Realizar levantamento dos pontos de captação de água nas propriedades com indicação sobre a existência de outorga, dispensa ou não regularização, além de cálculo estimativo do consumo volumétrico de água médio mensal por propriedade e adoção de possíveis soluções estruturais e socioeducativas visando a diminuição da pegada hídrica	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Realizar levantamento das fontes de consumo energético existentes (matriz energética) com indicação e quantificação do consumo de eletricidade, lenha, gás, gasolina e álcool (ao menos) e cálculo estimativo da emissão de carbono conforme modelo matemático a ser oportunamente indicado pela CONTRATANTE	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Realizar mapeamento de estradas, carregadores e trilhas internos e lindeiros às propriedades com indicação do tipo de uso atualmente realizado (pedestres, ciclistas, motociclistas, automóveis etc.)	A ser realizado até 10 de dezembro	



	Realizar levantamento de atrativos naturais potenciais e ou cadastrados	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Realizar levantamento de atrativos culturais potenciais e ou cadastrados	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Realizar levantamento de atrativos rurais potenciais e ou cadastrados	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Realizar levantamento de outros atrativos turísticos potenciais e ou existentes	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Realizar levantamento de evidências de impactos ambientais presentes e pretéritos	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Realizar levantamento do perfil socioeconômico e cultural de proprietários e residentes nas propriedades	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Realizar levantamento do perfil socioeconômico do público visitante do Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande, realizando contagem de pessoas, horários de acesso, procedência, motivação, dentre outras informações	A ser realizado até 10 de dezembro	



	Realizar levantamento e cadastramento dos prestadores de serviço na área de turismo & hospitalidade que, direta ou indiretamente, utilizam as propriedades para atividades comerciais, bem como indicação do tipo de transação comercial/contratual e monetária existente entre estes e os proprietários	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Realizar levantamento de possíveis áreas dentro das propriedades sob embargo ou alvo de ações civis, multas e termos de ajuste de conduta não encerrados	A ser realizado até 10 de dezembro	
	Elaborar diagnóstico de oferta (atrativos, estruturas e serviços levantados nos PIPs e empreendimentos externos) e de demanda para uso do Complexo com projeções quantitativas da visitação segmentada entre crianças, adultos, idosos, brasileiros e estrangeiros projetadas para os próximos 10 anos estipulados a partir da assinatura do contrato	A ser realizado até 10 de dezembro	
Elaborar um Plano de Negócios (PN) para o Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande visando contrato de cogestão, o qual envolva a anuência e participação dos proprietários	Elaborar um plano de operação da gestão territorial e do negócio. Incluir cálculo de capacidade de carga ou estudo similar da visitação no Complexo cuja metodologia será proposta pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE	Executado	
	Elaborar projeção dos investimentos, receitas e gastos envolvidos na operação.	Executado	
	Elaborar construção de cálculos de fluxos de caixa anuais descontados para os próximos 10 anos estipulados a partir da assinatura do contrato	Executado	



	Elaborar simulação de taxas mínimas e máximas de arrecadação com proposta de distribuição de receitas entre entidade cogestora, poder público e proprietários de imóveis inseridos no Complexo	Executado	
	Elaborar construção de modelo de governança participativa e arquitetura financeira para a gestão do Complexo	Executado	
	Elaborar elaboração de plano de implantação e comunicação do Complexo	Executado	

Tabela 2 – Status dos indicadores do TP 028/2020 em 10.11.2021

Meta	Indicadores	Status	Observação
Implantar e operacionalizar a área da laje da Pedra Grande contida no Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande	Estacionamentos delimitados, quantificados com pessoal capacitado para ordenar fluxo de veículos e levantamento de dados	Executado	
	Zoneamento delimitado com pessoal capacitado para promover seu correto uso	Executado	
	Plano de Ação para Voo livre elaborado, aprovado e em funcionamento	Executado	
	Trilha de acesso à Pedra Rachada recuperada	Executado	
	Trilha entre Pedra Rachada e Grota Funda recuperada	Executado	
	Demais trilhas restringidas e erosões controladas	Executado	
	Eventos e sessões de Figura e filmagem realizados dentro do procedimento	Executado	
Implantar roteiros	Quatro roteiros implantados	Executado	



turísticos integrados com atrativos e operadores turísticos locais	Duas divulgações em veículos distintos de comunicação realizadas	Executado	
Realizar ações de sensibilização e educação ambiental com público visitante	Implantação de rotina de coleta de informações básicas do público visitante que frequenta o Monumento Natural Estadual da Pedra Grande em seu horário de funcionamento	Executado	
	400 alunos da rede pública de ensino realizam atividades de educação ambiental	Não executado por fatores externos	As atividades escolares foram comprometidas durante a pandemia da COVID-19.
	Uma Cartilha de Boas Práticas e Educação Ambiental no Complexo desenvolvida e disponibilizada	Executado	
	Duas ações de voluntariado realizadas e divulgadas	Executado	
	Um evento de apresentação de resultados à sociedade realizado	Parcialmente Executado	Realização do evento em 12/02/2022
	Um Plano de Comunicação elaborado e executado	Executado	
Cadastrar e capacitar operadores turísticos locais organizando suas agendas de visitação com a disponibilidade de acesso aos atrativos por meio dos roteiros criados	Um curso de capacitação de operadores de turismo realizado	Parcialmente Executado	Curso elaborado, em preparação
	Cinco operadores de turismo cadastrados e capacitados	Parcialment e Executado	Operadores de turismo já cadastrados, com capacitação a ser realizada
	Modelo de agenda anual de visitação criado e aprovado	Executado	
Apresentar e aprovar	Um plano de trabalho apresentado e aprovado	Executado	



plano de trabalho sobre metodologia para elaboração de plano de uso do Complexo para atividades de Voo Livre e relatórios de monitoramento apresentados	Dois relatórios elaborados, sendo 1 semestral no mês 6 de execução e outro final no mês 12	Executado	
Cadastrar praticantes de voo livre que utilizem laje da Pedra Grande para decolagem e pouso	100% dos praticantes cadastrados	Executado	
Apresentar plano de trabalho sobre metodologia de monitoramento da visitação a ser implantada e relatórios de monitoramento apresentados	Um plano de trabalho apresentado e aprovado	Executado	
	Dois relatórios elaborados, sendo 1 semestral no mês 6 de execução e outro final no mês 12	Executado	
Criar calendário anual de eventos e ações	Programação mensalmente informada à sociedade	Executado	
	Ao menos 2 eventos abertos ao público no ano	Executado	
	Ao menos 3 ações abertas ao público no ano	Executado	
Obter parceria e adesão formal de proprietários	100% dos proprietários de imóveis que abrangem a Pedra Grande contactados e, ao menos, 80% dos imóveis com anuências conferidas à SIMBIOSE para desenvolver o projeto	A ser realizado até 10 de dezembro	



Elaborar conteúdo digital e impresso sobre boas práticas e educação ambiental no Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande	Uma Cartilha de Boas Práticas e Educação Ambiental elaborada	A ser realizado até 10 de dezembro	Cartilha de Educação Ambiental sendo elaborada
	Uma publicação em veículo oficial de comunicação realizada	A ser realizado até 10 de dezembro	Publicação em veículo Oficial
Realizar atividades conjuntas com Parque Natural Municipal da Grotta Funda	Ao menos 5 atividades, sendo uma para cada programa de gestão realizadas em conjuntos com equipe de gestão do Parque Natural Municipal da Grotta Funda	Executado	
Apresentar e aprovar Plano de Comunicação com estratégia a ser executada durante vigência do contrato e relatórios de acompanhamento	Um plano de comunicação apresentado e aprovado	Executado	
	Ao menos 80% das ações planejadas executadas	Executado	
	Dois relatórios de acompanhamento entregues, sendo um semestral (mês 6) e um anual (mês 12)	Executado	
Realizar evento de divulgação de resultados	Um evento de divulgação de resultados realizado ao fim do projeto	Parcialmente Executado	Realização do evento em 12/02/2022
	Presença da PEA, FF, além de representantes de ao menos 4 segmentos da sociedade civil local (meio ambiente, turismo, cultura, economia, entre outros)	Parcialmente Executado	Realização do evento em 12/02/2022



Combater incêndios florestais	80% dos incêndios ocorridos dentro do Complexo e na área de atuação das equipes de combate terem área queimada inferior a 1 hectare em zona de conservação, zona de preservação ou APP	Executado	
Implantar sinalização e controle de acesso	Início de vias de acesso oficiais sinalizado	Executado	
	Acessos e trilhas não oficiais e irregulares isolados com acesso impedido	Executado	
	“Placa de Projeto” instalada contando todos os parceiros, valor investido, resumo do projeto e outras informações	Executado	
	Sinalização e equipamentos para organização do estacionamento instalados	Executado	
	Barreiras para impedimento de fluxo instaladas	Executado	
	Cercas e quebra-corpos contra a passagem de bovinos, equinos, motos e veículos instalados	Executado	
	Controle de acesso implantado, com foco nos finais de semana e feriados	Executado	
Realizar operações para levantamento de evidências de impacto e	Vinte e quatro operações realizadas ao longo de 12 meses de contrato	Executado	



<p>contenção de usos indevidos dentro do Complexo (acampamentos, caça, coleta irregular de plantas, mineração, uso de trilhas não oficiais, manifestações religiosas, sessões de Figura e filmagem e eventos realizados sem permissão, dentre outros)</p>			
<p>Captar projetos de pesquisa em parceria com instituições públicas e ou privadas</p>	<p>Duas parcerias estabelecidas e dois projetos elaborados</p>	<p>A ser apresentada o até 10 de dezembro</p>	
<p>Apresentar e aprovar plano de trabalho contendo estratégia para desenvolvimento de Plano de Negócios</p>	<p>Um plano de trabalho apresentado e aprovado</p>	<p>Executado</p>	
	<p>Um Plano de Negócios elaborado e aprovado até o mês 9 de vigência do contrato</p>	<p>Executado</p>	
<p>Realizar a regularização ambiental e plano de manejo de propriedades contidas no Complexo</p>	<p>100% das propriedades contidas no Complexo com seus CAR realizados ou adequados</p>	<p>A ser realizado até 10 de dezembro</p>	<p>Ação sendo realizada junto aos proprietários que ainda não possuem CAR</p>



	Ao menos 80% das propriedades contidas no Complexo com Projetos Individuais de Propriedade (PIP) elaborados e aprovados pelos proprietários, PEA e Fundação Florestal	Executado	
Influenciar a restauração ecológica e conservação florestal nas propriedades com CAR e PIP	Ao menos 50% do total de Zona de Recuperação inserida dentro dos limites do complexo de visitação prevista nos planos de manejo do PNMGF, PEI e MoNa PG com projetos executivos encaminhados para o Programa Nascentes do Governo do Estado de São Paulo ou avançadas para compensações oriundas de TACs e TCRA's municipais	Executado	
	100% das áreas adicionais de floresta existentes dentro das propriedades do Complexo disponibilizadas para Compensação de Reserva Legal e Servidão Ambiental	Executado	
Elaborar e executar sistema de monitoramento da flora xérica persistente na Pedra Grande, assim como manejo teste para controle de espécies graminóides invasoras	100% da área da Pedra Grande recebendo monitoramento quali-quantitativo da riqueza esperada, da quantidade de área por micro-habitat da presença de espécies da flora invasoras e das evidências de impacto	Executado	
	Um projeto elaborado, aprovado e em execução para testar estratégias de manejo de POACEAE invasoras em ilhas de solo	Executado	



Tabela 3 – Novo Cronograma de Realização das atividades até 12.02.2022

Objetivos Específicos (Ações)	Atividades	Mês 01	Mês 02
Realizar ações emergenciais de ordenamento de uso do Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande para iniciar implantação do referido Plano de Uso Público	Apoiar demanda de visitação oriunda do Parque Natural Municipal da Grota Funda		
	Instalar sinalização e barreiras naturais ao ingresso de pessoas, veículos, equinos e bovinos nos acessos não oficiais do Complexo		
	Cadastrar e mapear todos os acessos ao Complexo, qualificando-os quanto ao tipo de acesso realizado (carros, motos, bicicletas, pedestres, cavalos <i>etc.</i>), quanto ao grau de conservação, quanto ao tipo e frequência de uso (regular e ou irregular, usado ou pouco usado, caça, coleta de plantas, motociclistas, ciclistas, pedestres <i>etc.</i>), enquadrá-los no zoneamento das UCs		
	Em parceria com Secretaria de Serviços Públicos da PEA, apoiar a CEMA na solicitação de prestação de serviços para manutenção de acessos regulares ou passíveis de regularização, considerando o trânsito de veículos no Complexo e em suas imediações que levam às entradas principais		
	Desenvolver roteiros que gerem a inserção da Laje da Pedra Grande no Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande e a interação deste complexo com atrativos naturais, rurais e culturais de propriedades privadas de seu entorno;		
	Firmar parcerias com a rede pública municipal de ensino e		



	rede pública estadual de ensino para promover estudos do meio em roteiros do Complexo		
	Firmar parcerias com a rede privada de ensino para promover estudos do meio em roteiros do Complexo		
	Realizar acantonamentos no Complexo em parceria com escolas, grupos de escoteiros e outros para a realização de atividades de observação de estrelas, fauna noturna e atividades lúdicas		
	Elaborar Cartilha de Boas-Vindas do Complexo na qual constem i) Manual de Conduta do estudante, do visitante, do operador de atividades de turismo e do prestador de serviços; ii) atividades permitidas e não permitidas; iii) plano de emergências; dentre outras informações		
	Cadastrar o <i>trade</i> de turismo local interessado em realizar atividades de visitaç�o no Complexo		
	Diagnosticar o perfil de visitantes atendidos pelo referido <i>trade</i> e o perfil desejado de visitaç�o para o Complexo		
	Definir atividades permitidas e n�o permitidas conforme materiais bibliogr�ficos de refer�ncia		
	Realizar capacitaç�o do <i>trade</i> de turismo para operar dentro do Complexo, considerando os roteiros guiados e autoguiados disponibilizados e a inserç�o de um protocolo de conduta a ser seguido pelo setor		
	Organizar agenda de visitaç�o dos roteiros guiados e autoguiados do parque;		
	Realizar cadastramento de volunt�rios interessados em realizar a�es (prevenç�o e combate a inc�ndios, manejo de		



	trilhas, manejo de cursos d'água, plantios, aulas, palestras, feiras de troca de alimentos, dentre outras)		
	Elaborar e aplicar atividades de vivências com a natureza em eventos de visitaç�o de escolas e instituiç�es		
Realizar a�es de prevenç�o e combate a inc�ndios florestais nas propriedades inseridas no Complexo e seu entorno	Realizar cadastramento de volunt�rios interessados em realizar a�es no Complexo (prevenç�o e combate a inc�ndios, manejo de trilhas, manejo de cursos d'�gua, plantios, aulas, palestras, feiras de troca de alimentos, dentre outras)		
	Promover treinamento para volunt�rios envolvendo comunidade do entorno e parceiros institucionais		
	Realizar vistorias em propriedades rurais que estejam usando a pr�tica do fogo para queima controlada de res�duos, informando sobre a ilicitude desta e de outras pr�ticas		
	Manter equipamento m�nimo de seguran�a e de combate a inc�ndios florestais		
	Em parceria com Secretaria de Servi�os P�blicos da PEA, apoiar a CEMA na solicitaç�o de prestaç�o de servi�os para ro�ada e manutenç�o de acessos visando incrementar sua funç�o enquanto aceiros mec�nicos		
	Efetuar a�es de monitoramento do risco de inc�ndio delimitando �reas mais suscet�veis � propagaç�o de inc�ndios bem como emitindo boletins de risco de inc�ndio com base em dados meteorol�gicos		
	Combater inc�ndios no Complexo e em suas imediaç�es		
	Ap�s inc�ndios, alimentar banco de dados (data,		





	coordenada UTM, horário de início, Tempo de Resposta, Duração do Combate, equipes envolvidas, número de pessoas envolvidas na operação, área queimada, vegetação atingida, localização em relação a áreas de especial interesse para conservação) suporte para elaboração de denúncia à CEMA ou Polícia Militar Ambiental (PMamb)		
	Realização de denúncias de incêndios florestais à CEMA ou PMamb com geração de número de protocolo e acompanhamento da apuração		
	Em conjunto com equipe de gestão do PNMGF, definir heliporto dentro do Complexo e mapeamento de corpos lacustres próximos para suporte aéreo às ações de combate a incêndios florestais na unidade, no PEI, no MONA e nas respectivas zonas de amortecimento		
Realizar ações de sensibilização e esclarecimento do público visitante acerca da realidade socioambiental e fundiária existente no Complexo	Elaborar questionário quali-quantitativo a ser aplicado previamente e/ou no ingresso à laje da Pedra Grande por sua estrada de acesso e por trilhas (Pousada Pedra Grande, Minha Deusa e Grota Funda) o qual considere a categorização do perfil do visitante, sua disposição futura pelo pagamento de ingresso para entrada e possível existência de pontos de Alimentos & Bebidas e hospedaria no local		
	Estabelecer contato e relação próxima com Secretaria de Comunicação da PEA para organização de pautas ao longo de todo o contrato		
	Elaborar Cartilha de Boas-Vindas do Complexo na qual constem i) Manual de Conduta do estudante, do visitante, do operador de atividades de turismo e do prestador de		



	serviços dentro do parque; ii) atividades permitidas e não permitidas; iii) plano de emergências; dentre outras informações		
	Realizar cadastramento de voluntários interessados em realizar ações no parque (prevenção e combate a incêndios, manejo de trilhas, manejo de cursos d'água, plantios, aulas, palestras, feiras de troca de alimentos, dentre outras)		
	Elaborar Plano de Comunicação que preveja a execução de ações de comunicação externa (vídeos, postagens, dentre outros)		
	Manter estreita e respeitosa relação com os proprietários de imóveis envolvidos no projeto, obtendo seu apoio e autorização formal para realização das atividades		
	Participar ativamente de discussões em fóruns municipais e regionais adequados para apresentar e esclarecer o projeto, além de divulgar seus resultados (conselhos municipais, conselhos das UCs envolvidas, câmaras municipais, dentre outros)		
	Manifestar-se quanto ao projeto somente por meio de veículos de comunicação oficiais do projeto		
	Realizar evento de finalização do projeto e apresentação de resultados		
Elaborar e executar monitoramento quali-quantitativo da visita a partir de método de coleta de informações a	Elaborar questionário quali-quantitativo a ser aplicado previamente e ou no ingresso à laje da Pedra Grande por sua estrada de acesso e por trilhas (Pousada Pedra Grande, Minha Deusa e Grota Funda) o qual considere a categorização do perfil do visitante, sua disposição futura		



ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela PEA	pelo pagamento de ingresso para entrada e possível existência de pontos de Alimentos & Bebidas e hospedaria no local		
Organizar, monitorar e fiscalizar as atividades de voo livre em parceria com o Clube Atibaiense de Voo Livre	Organizar, monitorar e fiscalizar as atividades de voo livre em parceria com o Clube Atibaiense de Voo Livre		
Elaborar e executar sistema de monitoramento da flora xérica persistente no Complexo, assim como manejo teste para controle de espécies graminóides invasoras	Realizar mapeamento de distribuição da vegetação e de sua riqueza (considerar dados primários e secundários)		
	Realizar quantificação de área (unidade – hectare) de campo rupestre perdida, considerando como data corte a abertura da estrada de acesso à laje da Pedra Grande		
	Levantar dados da riqueza específica esperada para os microhabitats denominados Ilhas de Solo a partir de uso de modelo matemático a ser considerado pela CONTRATADA e aprovado pela PEA		
	Realizar análise de evidências de impacto ambiental ocorrentes no Complexo (considerando dados primários e secundários) com metodologia a ser apresentada pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE		
Realizar ou adequar o Cadastro Ambiental Rural das propriedades contidas no Complexo de Visitação Laje da Pedra	Realizar ou adequar o Cadastro Ambiental Rural das propriedades contidas no Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande		



Grande			
Produzir Projetos Individuais de Propriedades (PIPs) em consonância com as adequações do CAR, do Programa de Regularização Ambiental (PRA) e dos instrumentos de gestão das UCs, quando se tratar de propriedades rurais	Levantar dados de hidrografia corrigida		
	Levantar dados de pedologia, declividade, clinometria e hipsometria (dados secundários);		
	Levantar dados de uso do solo nas propriedades		
	Levantar dados de áreas suscetíveis à ocorrência de movimentos de massa, erosão e inundação (utilizar dados secundários de IGC, DAEE, CPRM, dentre outros) aprovados pela PEA		
	Levantar dados de fragmentos de vegetação nativa e caracterização de estágio sucessional		
	Levantar dados de análise de fragmentação da vegetação nativa em um contexto de paisagem		
	Levantar dados de indicação das culturas agrícolas de subsistência, comerciais e demais atividades econômicas existentes		
	Levantar dados de limite e tamanho da propriedade (unidade de área - hectares)		
	Levantar dados de indicação de quantidade de módulos fiscais da propriedade em relação à unidade de módulos fiscais municipal		
	Levantar dados de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal (unidade de área – hectares)		
Levantar dados de áreas indicadas para execução de projetos de restauração ecológica, separando-as por técnica adequada à situação encontrada			



	Levantar dados de demanda eventual de cercamento para projeto de restauração ecológica (unidade de medida – metros)		
	Levantar dados de ativos florestais com possível indicação para Servidão Ambiental ou Cotas de Reserva Ambiental		
	Levantar dados de quantidade de pessoas residentes;		
	Levantar dados de número de residências e unidades habitacionais com indicação de número médio de residentes e visitantes para cálculo volumétrico estimativo de efluente gerado, além de levantamento de sistemas de disposição e tratamento de efluentes atualmente utilizados (proposta de instalação de saneamento rural, se for o caso)		
	Levantar dados de caracterização volumétrica e qualitativa (lixo comum, lixo reciclável e lixo orgânico) dos resíduos sólidos gerados, bem como indicação da(s) destinação(ões) e mapeamento da área de cobertura da coleta de lixo municipal (mapa com polígono da área de cobertura e informação de dias e horários da coleta, caso exista o sistema público)		
	Realizar levantamento dos pontos de captação de água nas propriedades com indicação sobre a existência de outorga, dispensa ou não regularização, além de cálculo estimativo do consumo volumétrico de água médio mensal por propriedade e adoção de possíveis soluções estruturais e socioeducativas visando a diminuição da pegada hídrica		



	Realizar levantamento das fontes de consumo energético existentes (matriz energética) com indicação e quantificação do consumo de eletricidade, lenha, gás, gasolina e álcool (ao menos) e cálculo estimativo da emissão de carbono conforme modelo matemático a ser oportunamente indicado pela CONTRATANTE		
	Realizar mapeamento de estradas, carreadores e trilhas internos e lindeiros às propriedades com indicação do tipo de uso atualmente realizado (pedestres, ciclistas, motociclistas, automóveis etc.)		
	Realizar levantamento de atrativos naturais potenciais e ou cadastrados		
	Realizar levantamento de atrativos culturais potenciais e ou cadastrados		
	Realizar levantamento de atrativos rurais potenciais e ou cadastrados		
	Realizar levantamento de outros atrativos turísticos potenciais e ou existentes		
	Realizar levantamento de evidências de impactos ambientais presentes e pretéritos		
	Realizar levantamento do perfil socioeconômico e cultural de proprietários e residentes nas propriedades		
	Realizar levantamento do perfil socioeconômico do público visitante do Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande, realizando contagem de pessoas, horários de acesso, procedência, motivação, dentre outras informações		



	Realizar levantamento e cadastramento dos prestadores de serviço na área de turismo & hospitalidade que, direta ou indiretamente, utilizam as propriedades para atividades comerciais, bem como indicação do tipo de transação comercial/contratual e monetária existente entre estes e os proprietários		
	Realizar levantamento de possíveis áreas dentro das propriedades sob embargo ou alvo de ações civis, multas e termos de ajuste de conduta não encerrados		
	Elaborar diagnóstico de oferta (atrativos, estruturas e serviços levantados nos PIPs e empreendimentos externos) e de demanda para uso do Complexo com projeções quantitativas da visitação segmentada entre crianças, adultos, idosos, brasileiros e estrangeiros projetadas para os próximos 10 anos estipulados a partir da assinatura do contrato		
Elaborar um Plano de Negócios (PN) para o Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande visando contrato de cogestão, o qual envolva a anuência e participação dos proprietários	Elaborar um plano de operação da gestão territorial e do negócio. Incluir cálculo de capacidade de carga ou estudo similar da visitação no Complexo cuja metodologia será proposta pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE		
	Elaborar projeção dos investimentos, receitas e gastos envolvidos na operação.		
	Elaborar construção de cálculos de fluxos de caixa anuais descontados para os próximos 10 anos estipulados a partir da assinatura do contrato		
	Elaborar simulação de taxas mínimas e máximas de arrecadação com proposta de distribuição de receitas entre		



	entidade cogestora, poder público e proprietários de imóveis inseridos no Complexo		
	Elaborar construção de modelo de governança participativa e arquitetura financeira para a gestão do Complexo		
	Elaborar elaboração de plano de implantação e comunicação do Complexo		

Tabela 4 – Novo cronograma de realização dos indicadores do TP 028/2020

Meta	Indicadores	Mês 1	Mes 2
Implantar e operacionalizar a área da laje da Pedra Grande contida no Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande	Estacionamentos delimitados, quantificados com pessoal capacitado para ordenar fluxo de veículos e levantamento de dados		
	Zoneamento delimitado com pessoal capacitado para promover seu correto uso		
	Plano de Ação para Voo livre elaborado, aprovado e em funcionamento		
	Trilha de acesso à Pedra Rachada recuperada		
	Trilha entre Pedra Rachada e Grota Funda recuperada		
	Demais trilhas restringidas e erosões controladas		
	Eventos e sessões de Figura e filmagem realizados dentro do procedimento		
Implantar roteiros	Quatro roteiros implantados		



turísticos integrados com atrativos e operadores turísticos locais	Duas divulgações em veículos distintos de comunicação realizadas		
Realizar ações de sensibilização e educação ambiental com público visitante	Implantação de rotina de coleta de informações básicas do público visitante que frequenta o Monumento Natural Estadual da Pedra Grande em seu horário de funcionamento		
	400 alunos da rede pública de ensino realizam atividades de educação ambiental		
	Uma Cartilha de Boas Práticas e Educação Ambiental no Complexo desenvolvida e disponibilizada		
	Duas ações de voluntariado realizadas e divulgadas		
	Um evento de apresentação de resultados à sociedade realizado		
	Um Plano de Comunicação elaborado e executado		
Cadastrar e capacitar operadores turísticos locais organizando suas agendas de visitação com a disponibilidade de acesso aos atrativos por meio dos roteiros criados	Um curso de capacitação de operadores de turismo realizado		
	Cinco operadores de turismo cadastrados e capacitados		
	Modelo de agenda anual de visitação criado e aprovado		
Apresentar e aprovar plano de trabalho sobre metodologia para elaboração de plano de	Um plano de trabalho apresentado e aprovado		
	Dois relatórios elaborados, sendo 1 semestral no mês 6 de execução e outro final no mês 12		



uso do Complexo para atividades de Voo Livre e relatórios de monitoramento apresentados			
Cadastrar praticantes de voo livre que utilizem laje da Pedra Grande para decolagem e pouso	100% dos praticantes cadastrados		
Apresentar plano de trabalho sobre metodologia de monitoramento da visitação a ser implantada e relatórios de monitoramento apresentados	Um plano de trabalho apresentado e aprovado		
	Dois relatórios elaborados, sendo 1 semestral no mês 6 de execução e outro final no mês 12		
Criar calendário anual de eventos e ações	Programação mensalmente informada à sociedade		
	Ao menos 2 eventos abertos ao público no ano		
	Ao menos 3 ações abertas ao público no ano		
Obter parceria e adesão formal de proprietários	100% dos proprietários de imóveis que abrangem a Pedra Grande contactados e, ao menos, 80% dos imóveis com anuências conferidas à SIMBIOSE para desenvolver o projeto		
Elaborar conteúdo digital e impresso sobre boas	Uma Cartilha de Boas Práticas e Educação Ambiental elaborada		



práticas e educação ambiental no Complexo de Visitação Laje da Pedra Grande	Uma publicação em veículo oficial de comunicação realizada		
Realizar atividades conjuntas com Parque Natural Municipal da Grota Funda	Ao menos 5 atividades, sendo uma para cada programa de gestão realizadas em conjuntos com equipe de gestão do Parque Natural Municipal da Grota Funda		
Apresentar e aprovar Plano de Comunicação com estratégia a ser executada durante vigência do contrato e relatórios de acompanhamento	Um plano de comunicação apresentado e aprovado		
	Ao menos 80% das ações planejadas executadas		
	Dois relatórios de acompanhamento entregues, sendo um semestral (mês 6) e um anual (mês 12)		
Realizar evento de divulgação de resultados	Um evento de divulgação de resultados realizado ao fim do projeto		
	Presença da PEA, FF, além de representantes de ao menos 4 segmentos da sociedade civil local (meio ambiente, turismo, cultura, economia, entre outros)		
Combater incêndios florestais	80% dos incêndios ocorridos dentro do Complexo e na área de atuação das equipes de combate terem área queimada inferior a 1 hectare em zona de conservação, zona de preservação ou APP		



Implantar sinalização e controle de acesso	Início de vias de acesso oficiais sinalizado		
	Acessos e trilhas não oficiais e irregulares isolados com acesso impedido		
	“Placa de Projeto” instalada contando todos os parceiros, valor investido, resumo do projeto e outras informações		
	Sinalização e equipamentos para organização do estacionamento instalados		
	Barreiras para impedimento de fluxo instaladas		
	Cercas e quebra-corpos contra a passagem de bovinos, equinos, motos e veículos instalados		
	Controle de acesso implantado, com foco nos finais de semana e feriados		
Realizar operações para levantamento de evidências de impacto e contenção de usos indevidos dentro do Complexo (acampamentos, caça,	Vinte e quatro operações realizadas ao longo de 12 meses de contrato		



coleta irregular de plantas, mineração, uso de trilhas não oficiais, manifestações religiosas, sessões de Figura e filmagem e eventos realizados sem permissão, dentre outros)			
Captar projetos de pesquisa em parceria com instituições públicas e ou privadas	Duas parcerias estabelecidas e dois projetos elaborados		
Apresentar e aprovar plano de trabalho contendo estratégia para desenvolvimento de Plano de Negócios	Um plano de trabalho apresentado e aprovado		
	Um Plano de Negócios elaborado e aprovado até o mês 9 de vigência do contrato		
Realizar a regularização ambiental e plano de manejo de propriedades contidas no Complexo	100% das propriedades contidas no Complexo com seus CAR realizados ou adequados		
	Ao menos 80% das propriedades contidas no Complexo com Projetos Individuais de Propriedade (PIP) elaborados e aprovados pelos proprietários, PEA e Fundação Florestal		
Influenciar a restauração ecológica e conservação florestal nas propriedades com CAR e PIP	Ao menos 50% do total de Zona de Recuperação inserida dentro dos limites do complexo de visitação prevista nos planos de manejo do PNMGF, PEI e MoNa PG com projetos executivos encaminhados para o Programa Nascentes do		



	Governo do Estado de São Paulo ou avençadas para compensações oriundas de TACs e TCRA's municipais		
	100% das áreas adicionais de floresta existentes dentro das propriedades do Complexo disponibilizadas para Compensação de Reserva Legal e Servidão Ambiental		
Elaborar e executar sistema de monitoramento da flora xérica persistente na Pedra Grande, assim como manejo teste para controle de espécies graminóides invasoras	100% da área da Pedra Grande recebendo monitoramento quali-quantitativo da riqueza esperada, da quantidade de área por micro-habitat da presença de espécies da flora invasoras e das evidências de impacto		
	Um projeto elaborado, aprovado e em execução para testar estratégias de manejo de POACEAE invasoras em ilhas de solo		



2. Justificativa e continuidade do Plano de Trabalho

O Termo de Parceria nº 028/2020 possui executadas 38 atividades (49%) e 42 indicadores (79%), representando a maioria dos status e ainda um número significativo de atividades e indicadores a serem realizados até o dia 10 de dezembro, incluindo 31 atividades (40%) e 5 indicadores (9%). Tal universo já executado abrange principalmente as atividades e indicadores planejados para execução ao longo dos 12 meses, como aqueles relacionados à rotina de monitoramento do território, manejo das erosões das trilhas, ordenamento do uso público, entre outros. As atividades a serem entregues até o dia 10 de dezembro contemplam ações dos Planos Individuais de Propriedade e a Cartilha de Educação Ambiental.

No que tange as atividades parcialmente executadas, temos 3 atividades (4%) e 5 indicadores (10%). Apontamos que essas atividades e indicadores somadas as atividades contínuas relacionados ao monitoramento e ordenamento do uso público no período de verão, onde esperamos um possível aumento significativo no fluxo de visitação, devido as férias e festividades de final de ano, bem como a flexibilização das regras sanitárias da pandemia da COVID-19, representam as principais causas do pedido de prorrogação de prazo do TP 028/2020.

As atividades de controle de visitantes e do voo livre, o monitoramento de barreiras contra o ingresso de veículos nos acessos não oficiais, sinalização, prevenção e combate a incêndios florestais dentro do Complexo, entre outras atividades apontadas no novo cronograma, garante a continuidade de uma rotina de monitoramento da equipe deste projeto consolidada e elogiada pela sociedade para com as atividades de uso público, evitando a propagação de impactos negativos sobre os recursos naturais. É nítida a transformação positiva causada por esse Termo de Parceria sobre o território e a SIMBIOSE, tão pouco os parceiros e proprietários não gostariam de presenciar o retrocesso dessas ações.



Cabe ressaltar que já começamos a organizar um evento de finalização do projeto e apresentação de resultados junto a sociedade e parceiros e que também precisa de tempo e cuidado para sua organização, levando em conta as restrições sanitárias da pandemia.

Infelizmente, as cinco atividades e um indicador que demandam envolvimento de estudantes ou de visitantes oriundos do Parque Natural Municipal da Grotta Funda, não foram realizados em 2020 e 2021 devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19, fato que prejudicou o calendário escolar desses dois anos e a abertura do PNM da Grotta Funda, ainda em obras.

Apesar das atividades de estudos do meio estarem comprometidas com o público escolar, este projeto tem oferecido aos visitantes da laje da Pedra Grande que frequentam o local durante o final de semana, atividades de visitas guiadas. Essas são oferecidas em dois horários, manhã e tarde, durante os dois dias do final de semana ou feriados. A visita guiada tem duração de 40 minutos e tem como objetivo transmitir um conteúdo socioambiental sobre o território, incluindo falas sobre a flora e a fauna, recursos hídricos, relevo, unidades de conservação, cidades visíveis e o voo livre. Aproximadamente, 15 a 20 pessoas ao todo participam das visitas guiadas por final de semana desde junho de 2021.

Ressalta-se que com a prorrogação de prazo até a data de 12 de fevereiro de 2022 necessita de um aporte de R\$ 49.996,72 do Fundo Municipal de Defesa de Meio Ambiente, para se somar com o valor em caixa e cumprir com todos os seus compromissos.

Desta forma, pretendemos custear as despesas até o dia 10 de dezembro de 2021 com o valor em caixa de R\$ 44.592,37 e somar R\$ 49.996,72 para execução das atividades até o dia 12 de fevereiro de 2022 da seguinte maneira:



NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
EQUIPE (Remuneração + Encargos)	R\$ 36.984,72
Material de Consumo	R\$ 9.030,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 3.982,00
Material Permanente	R\$ -
	R\$ 49.996,72

Valor em caixa em 10/11/2021 - R\$ 44.592,37

Valor solicitado neste aditivo – R\$ 49.996,72

Valor total – R\$ 94.589,09

Fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Humberto Zontini Malheiros

Gestor do Termo de Parceria 028/2020

